

01 基礎工事

1-1 基礎 アンカーボルト①

■アンカーフレーム設置の写真

施工管理者 月 日

アンカーフレーム設置の確認

- ・捨てコンクリート打設後設置



1-1 基礎 アンカーボルト②

■アンカーボルトの固定の写真

施工管理者 月 日

アンカーボルトの確認

- ・種類、材質、形状、寸法の確認
- ・アンカーボルト本数、位置の確認
- ・アンカーボルトの固定状況の確認
- ・基礎との緊結状況の確認



1-2 基礎完了

■基礎天端レベルチェック図

施工管理者 月 日

基礎梁状況の確認


- ・基礎梁の有害なひび割れの有無

基礎梁のレベル確認

- ・許容値 $\pm 2\text{mm}$
- ・測定地点の数値チェック

アンカーボルトの位置と高さ確認

- ・ χ マーク金物 $\pm 5\text{mm}$
- ・引きボルト $\pm 3\text{mm}$

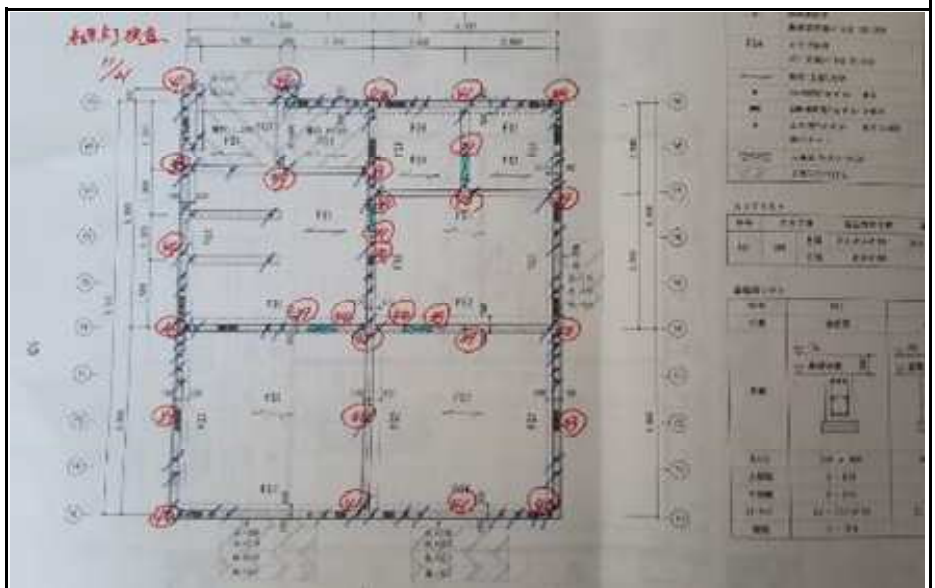

02 土台工事

2-1 ねこ土台・χマーク金物

■金物設置後の写真

施工管理者 月 日

□χマーク金物の位置確認

- ・TB : ねこ土台の上に設置
- ・SMB : 基礎梁の上に直に設置

□ねこ土台の設置状況確認

- ・気密タイプの位置を確認
- ・隙間なく敷き詰めてるか確認

□TB・SMB用ボルトの本締め確認

- ・丸座金+六角ナット



施工管理者 月 日



施工管理者 月 日

03 建方工事 【1階壁】

3-1 1階CLT壁パネル材料①

■仮置き状況の写真

施工管理者 月 日

CLT壁パネルの確認

- ・ 出荷証明、納品書等の確認
- ・ 破損、変型の有無
- ・ 現しパネルの有無
- ・ 事前加工箇所の確認
- ・ 先付金物の確認
- ・ 事前防腐防蟻処理箇所の確認

施工順および仮置きの確認

吊り具の確認



3-1 1階CLT壁パネル材料②

■防腐防蟻処理の写真

施工管理者 月 日

防腐防蟻処理の確認

- ・ 出荷証明、納品書等の確認
- ・ 未処理の1階壁パネルにおいては、現場にてパネル下端およびGLより1mの範囲の側面に防腐防蟻処理を行う。




3-2 1階CLT壁パネルの建入

■壁の倒れチェック図面

施工管理者 月 日

壁の倒れ確認

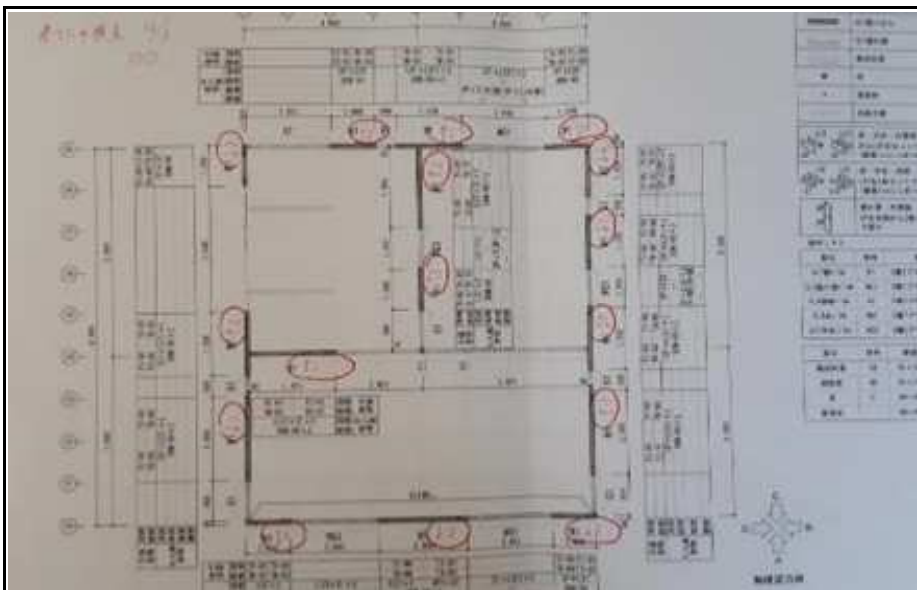

04 建方工事 【2階床】

4-1 2階CLT床パネル敷込①

■床パネル敷き込み完了の確認

施工管理者 月 日


- 床開口部の安全対策の確認
- 1階外壁パネルとの面合わせ確認
- 合板スプラインの全ビス留め確認
- STFの位置、全ビス留め確認
- TCの位置、ボルト本締め確認



4-1 2階CLT床パネル敷込②

■STFの位置、全ビス留め確認チェック図

施工管理者 月 日

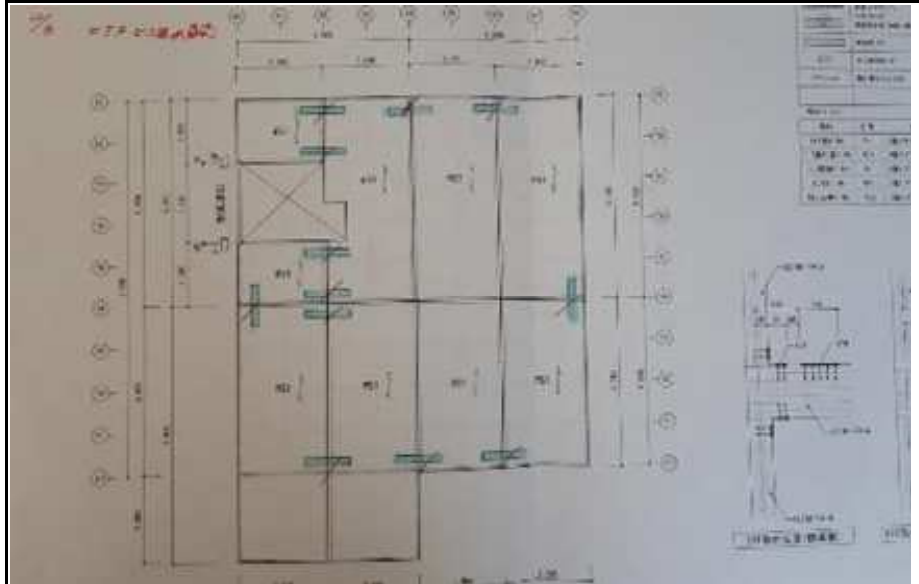

4-1 2階CLT床パネル敷込③

■STFのビス留め確認の写真

施工管理者 月 日



04 建方工事 【2階床】

4-1 2階CLT床パネル敷込④

■合板スプラインのビス留めピッチの確認

施工管理者 月 日



■

施工管理者 月 日

■

施工管理者 月 日


05 建方工事 【2階壁】

5-1 2階CLT壁パネルの建入

■壁の倒れチェック図面

施工管理者 月 日

□壁の倒れ確認

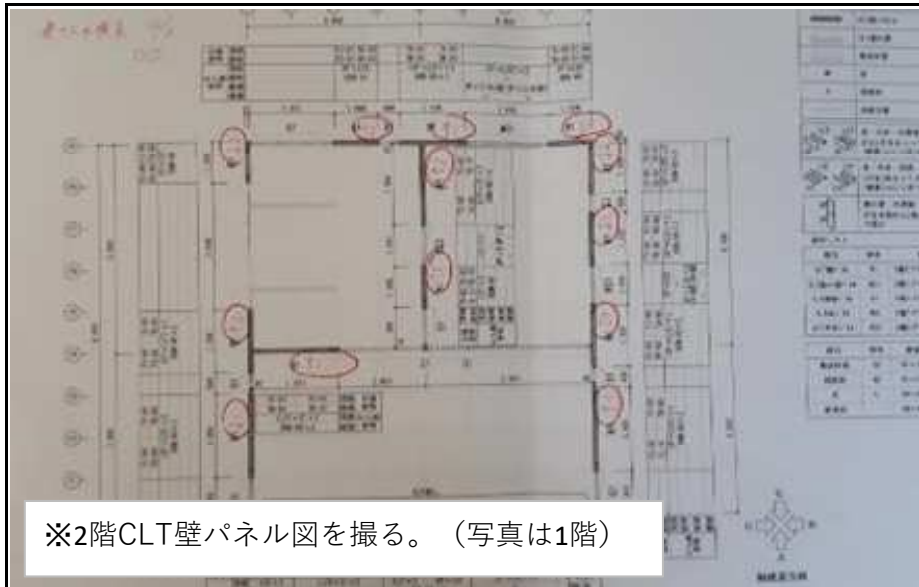

※2階CLT壁パネル図を撮る。(写真は1階)

■

施工管理者 月 日

■

施工管理者 月 日

06 建方工事 【小屋組】

6-1 2階CLT天井パネル敷込①

■天井パネル敷き込み完了の確認

施工管理者 月 日


- 2階外壁パネルとの面合わせ
- 合板スプラインのビス留め確認
- STFの位置、ビス留め確認
- TCのボルト本締め確認



6-1 2階CLT天井パネル敷込②

■STFの位置、全ビス留め確認チェック図

施工管理者 月 日

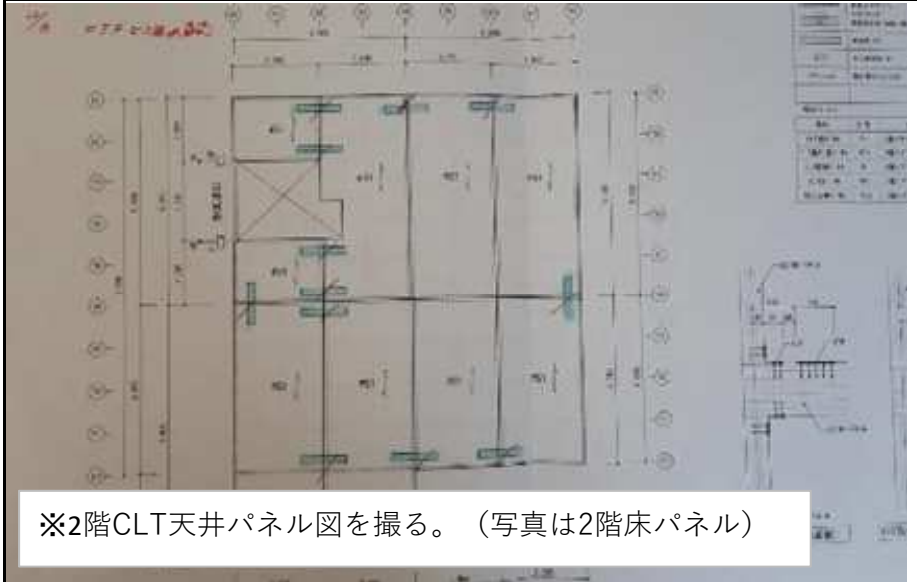

※2階CLT天井パネル図を撮る。(写真は2階床パネル)

6-1 2階CLT天井パネル敷込③

■STFのビス留め確認の写真

施工管理者 月 日



06 建方工事 【小屋組】

6-1 2階CLT天井パネル敷込④

■合板スプラインのビス留めピッチの確認

施工管理者 月 日



6-2 屋根

■小屋組

施工管理者 月 日

- 材料の確認
- 火打ち材、振止め等の設置状況の確認
- 接合部の金物等の確認



■

施工管理者 月 日

07 上棟


7-1 1階接合金物の確認①

■1階全ビス留め確認チェック図

施工管理者 月 日

1階LST金物の個数および全ビス留め確認

1階SP金物の設置位置 (内外) および全ビス留め確認

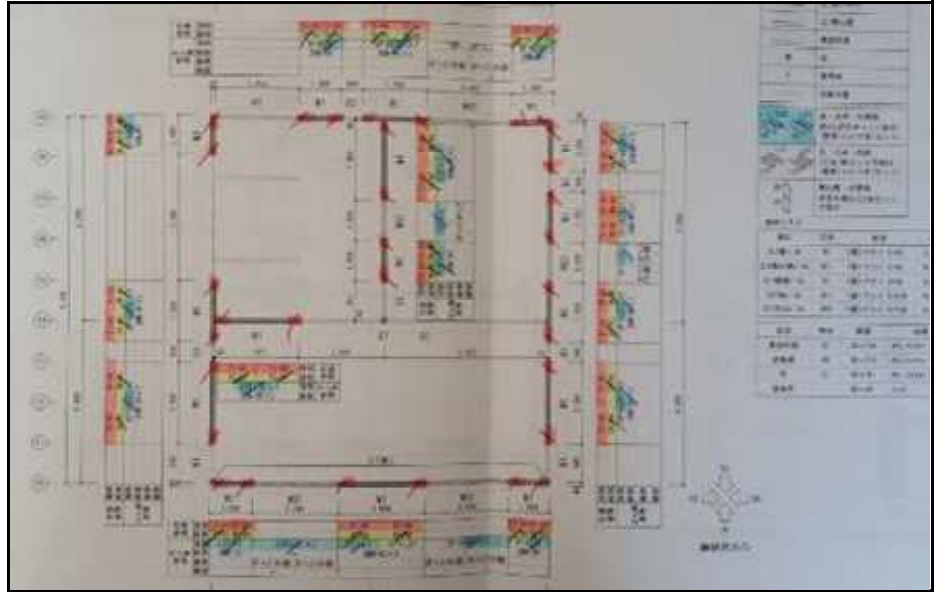

7-1 1階接合金物の確認②

■LST金物 (内側)

施工管理者 月 日



7-1 1階接合金物の確認③

■SP金物 (外側)

施工管理者 月 日



07 上棟


7-2 2階接合金物の確認①

■2階全ビス留めチェック図

施工管理者 月 日

2階LST金物の個数および全ビス留め確認

2階SP金物の設置位置 (内外) および全ビス留め確認

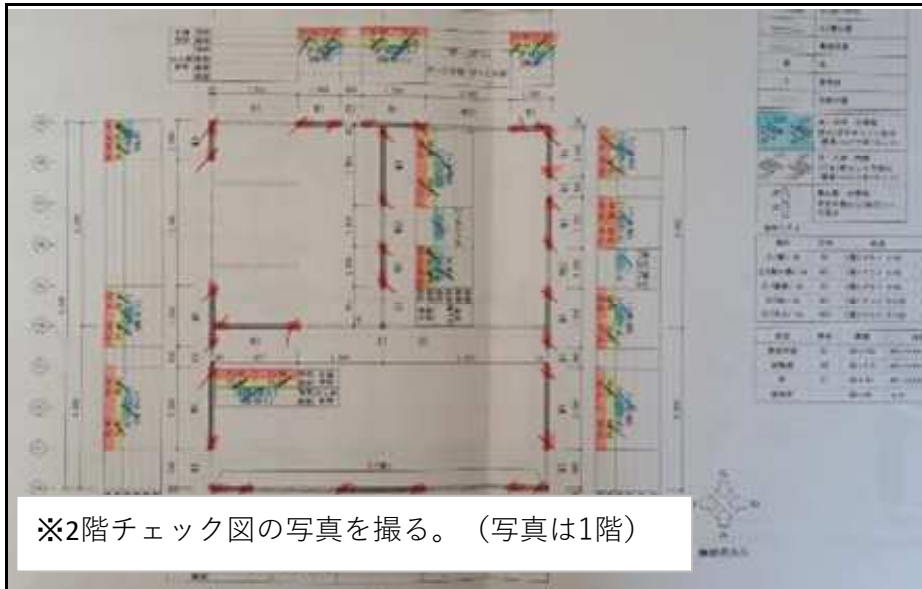

※2階チェック図の写真を撮る。(写真は1階)

7-2 2階接合金物の確認①

■LST金物 (内側)

施工管理者 月 日



7-2 2階接合金物の確認③

■SP金物 (外側)

施工管理者 月 日



07 上棟

7-3 防腐防蟻処理①

■施工報告書

施工管理者 月 日

◆ 施工完了報告書
 作成年月日 2019年 11月 22日
 施工管理者 (株)
 作成者
 工事名称
 現場住所
 施工完了日 (土曜前迄) 2019年 10月 0日
 施工完了日 (木曜前迄) 2019年 11月 08日

工事内容
 基礎部: 基礎内部全面、土間部分、ガラス部分、勝手口部分等
 柱部処理: 基礎部全面、土間部分、ガラス部分、勝手口部分等

7-3 防腐防蟻処理②

■施工報告書 (施工写真)

施工管理者 月 日



施工管理者 月 日
